PROGRAMA DE SEGURIDAD
RESOLUCIÓN SRT Nº 035/98

EMPRESA:	**BAGJ CONSTRUCTORA SRL**
Actividad:	Obras Civiles
Domicilio:	Pieres 226 6° B C.A.B.A.
Contrato de Afiliación:	246234
CUIT:	30-71092291-4
Tel. /Fax:	(011) 15-6633-3707
Fecha de confección:	12-01-2022

NOMBRE OBRA:	**ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA ESCOCESA SAN ANDRES**
Dirección:	Nogoya 550, Olivos, Bs. As.
Comitente:	**ASOCIACION CIVIL EDUCATIVA ESCOCESA SAN ANDRES**
CUIT:	30-52982680-6
Fecha de inicio: 13-01-2022	**Fecha probable de finalización: 13-02-2022**

ASEGURADORA:	**PROVINCIA A.R.T.**
Domicilio:	Carlos Pellegrini 91 CABA
TE:	(011) 0-800-333-1278

APROBACIÓN DEL PROGRAMA POR EL PREVENCIONISTA DE PROVINCIA A.R.T.

	FIRMA	ACLARACIÓN

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

CONTENIDOS

DESCRIPCION DE OBRA

NOMINA DE PERSONAL

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

RIESGOS EMERGENTES PREVISTOS POR ETAPAS

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

PROTOCOLO COVID 19

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

CRONOGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA DE OBRA	13/01 al 20/01 2022	20/01 al 27/01 2022	27/01 al 03/02 2022	03/02 al 13/02 2022
NOGOYA 550				
Perdida de agua en pasillo, reparacion.				
tabiqueria de placa de yeso				
Retiro de cerramiento de estacionamiento de canchas de Hockey				
Instalacion de caños de 100mm pozo y hormigonado.				
RSP 601				
instalacion de pisos vinilico en oficinas				
colocacion de cielorasos				
pintura de cielorasos y muros				
pintura de puertas				
reparacion de perdida de agua				
BIBLIOTECA				
desmonte de cielorraso				
armado de nuevo cieloraso				
tabiqueria de placa de yeso				
pintura interior				
colocacion de puerta				
colocacion de paño fijo				
colocacion de vidrios				

NOTA SOBRE DIRECCION DE OBRA

En la presente obra, debido a que no hay trabajos de reformas estructurales o modificaciones profundas no se cuenta con cartel de obra y por lo tanto con un director de obra matriculado que pueda firmar como tal el presente programa. Pero se aclara que se cumplirá con la normativa vigente de la Res. 51/97 firmando la Arq. Milagros Pandre Mat. CPAU 31056 como director de obra.

NOMINA DE PERSONAL

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

Provincia ART

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 5468088

Buenos Aires, 05 / 01 / 2022
Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social **BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L.**

C.U.I.T. N° **30-71092291-4** | N° de Contrato **246234** | N° de Póliza Digital **4723152**

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle **PIERES** | N° **266** | Piso **6** | Oficina **B**

Localidad **CAPITAL FEDERAL** | Provincia **CAPITAL FEDERAL** | Código Postal **1408**

Teléfono **20504937** | Fecha de afiliación **26 / 11 / 2018** | Vigencia **01 / 12 / 2018** al **30 / 11 / 2022**

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad **2**

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

410021 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales

C.U.I.L.	NOMBRE Y APELLIDO	TAREA
27-05618377-4	-ALTA-	
20-26651322-5	BARRIOS MARIO CESAR	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-42618172-0	BENITEZ MARIANO GASTON	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-40098658-5	BRIGAS MARIANO DAVID	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-37426882-2	BRITO NICOLAS EDUARDO	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-18347660-3	BULDINI WALTER GUSTAVO	OFICIAL ALBAÑIL
20-33261986-2	CANTU MIGUEL ANGEL	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-23046917-3	FERREYRA ALEJANDRO MIGUEL	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-36697983-3	FERREYRA EMANUEL	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-95062626-8	MOLINAS FLEITAS OSVALDO RAMON	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-41731952-3	NETO EZEQUIEL EDGARDO DE JESUS	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-36824208-0	PANOZZO MAURO ALBERTO	
20-18370741-9	VARGAS BRUNO JESUS	OFICIAL ALBAÑIL

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. N°: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provincart.com.ar - info@provart.com.ar

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL

TE-05 F013

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

Provincia ART

CERTIFICADO DE COBERTURA
N° 5468088

Buenos Aires, 05 / 01 / 2022
Página 2 de 2

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social **BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L.**

C.U.I.T. N° **30-71092291-4** | N° de Contrato **246234** | N° de Póliza Digital **4723152**

DOMICILIO CONSTITUIDO

Calle **PIERES** | N° **266** | Piso **6** | Oficina **B**

Localidad **CAPITAL FEDERAL** | Provincia **CAPITAL FEDERAL** | Código Postal **1408**

Teléfono **20504937** | Fecha de afiliación **26 / 11 / 2018** | Vigencia **01 / 12 / 2018** al **30 / 11 / 2022**

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad **2**

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

410021 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales

C.U.I.L.	NOMBRE Y APELLIDO	TAREA
20-23527075-8	VILLALBA ALEJANDRO	OFICIAL ALBAÑIL
23-41198066-9	WILLIAMS CRISTOPHER	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
23-22702117-9	WILLIAMS HECTOR SANTOS	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
20-35979301-5	WILLIAMS JON	OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES

Para corroborar los datos y consultar sobre la emisión de este certificado de cobertura, Provincia ART dispone de la casilla certificados@provart.com.ar.

Provincia A.R.T. S.A.
Código de A.R.T.: 0005-1 - C.U.I.T. N°: 30-68825409-0
Carlos Pellegrini 91 - (C1009ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4819-2800 - Fax: (011) 4819-2888
www.provincia rt.com.ar - info@provart.com.ar

TE-05 F013

ACT. FLORENCIA FIRENZE
GERENTE TECNICA ACTUARIAL

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, realizará las siguientes funciones:

- Asesorar a la Dirección o Jefatura de obra en todo lo concerniente al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Aportar a la planificación de los trabajos las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y enfermedades profesionales.
- Capacitar al personal en la materia.
- Confeccionar y mantener actualizada la documentación de obra.
- Realizar inspecciones en obra, verificando las condiciones de seguridad.

El o los profesionales de Higiene y Seguridad firmantes, en su calidad de asesores externos actuaran en coordinación con el Jefe de Obra o Encargado, dejando expresa constancia, que son profesionales independientes que no forman parte de la empresa, prestando labores profesionales de asesoramiento externo en Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Empresa, en el domicilio especificado para la presente Obra, lo cual no quiere decir ser los asesores de la Empresa en forma integral o para todas sus Obras.
El Asesor externo en Higiene y Seguridad en el Trabajo, no ha participado en el Proyecto, ni en los cálculos de estructuras, instalaciones, ni tampoco compra o distribuye materiales, herramientas, elementos de protección personal; tampoco desarma, repara o controla internamente, máquinas herramientas y equipos, tampoco selecciona, ni categoriza personal ni hace asignación de tareas. Tiene funciones consultivas y no ejecutivas, siendo estas últimas incumbencias del responsable de las tareas, léase Ejecutor o Constructor de la Obra, Director de Obra, Jefe de Obra, Capataz y Operario.

Las prestaciones del servicio dando cumplimiento a la legislación vigente estarán a cargo de:

Lic. Juan Martin Revuelta
DNI 29.150.653
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
MAT. CPIC 61
TE: 15 5039-5392
juanhvs@hotmail.com

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

En el presente plan se consideró el siguiente temario:

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

SEÑALIZACIÓN EN OBRA

EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PRIMEROS AUXILIOS

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIAS

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

1. OBLIGACIONES DEL PERSONAL

- Cumplir con las normas de prevención y reglas de higiene y seguridad que se establezcan y con las obligaciones de uso, conservación y cuidado de los elementos de protección personal.

- Cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de seguridad e higiene y cumplir con sus indicaciones.

- Realizarse los exámenes médicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen.

- Participar y colaborar con los programas de capacitación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dicten.

- Comunicar al Capataz o Supervisor cualquier anormalidad que pueda significar un riesgo para su salud y seguridad.

- Utilizar las herramientas y equipos de trabajo conforme a los requisitos o normas de seguridad correspondientes.

- **No introducir y/o consumir bebidas alcohólicas ni estimulantes dentro de la obra. No se permitirá desarrollar tareas a una persona en estado de ebriedad, la misma deberá abandonar el lugar de trabajo inmediatamente.**

2. SEÑALIZACIÓN EN OBRA

Las características y lugares a señalizar serán según las particularidades de la Obra.
Señalización de elementos de seguridad personal, riesgos de caída a nivel, salidas de emergencia, la ubicación de extintores de incendio, ubicación de botiquín; y riesgo eléctrico.

3. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Equipamiento y roles a cargo del Comitente.
Se utilizarán elementos existentes para actuar en caso de principio de incendios.
Los elementos se encontrarán en sitios de fácil acceso y convenientemente señalizados, favoreciendo de esta manera su visualización.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

Para el tratamiento primario de heridas o lesiones se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en nuestro Obrador, conteniendo suficiente cantidad de los siguientes elementos:

- Agua oxigenada (10 volúmenes)
- Pervinox u otro antiséptico similar.
- Gasas y vendas esterilizadas.
- Cinta adhesivas.
- Pomada para quemaduras.
- Baño ocular y colirio.
- Algodón.

En Obra se dispondrá permanentemente de formularios de derivación al Servicio Médico de PROVINCIA ART

5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PROGRAMA DE CAPACITACION 2022												
TEMAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD												
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES												
USO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS												
ORDEN Y LIMPIEZA												
TRABAJO EN ALTURA												
RIESGO ELECTRICO												
PREVENCION CONTRA INCENDIOS												
USO DE EPP												
PRIMEROS AUXILIOS												
PLAN DE EVACUACION												
PERMISO DE TRABAJO SEGURO												
PROTOCOLO COVID 19												

La capacitación al personal se efectúa según el Programa Anual de BAGJ CONSTRUCTORA SRL aplicada en sus diferentes Obras. En particular en cada Obra se refuerza la capacitación con los riesgos característicos de cada Obra

6. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal, se seleccionaron en función de los riesgos emergentes. Tenemos los de uso general en obra y los específicos según la tarea desempeñada por el trabajador.
Se entregarán al personal que correspondiera los elementos de protección que se detallan, **quedando constancia con su firma en una ficha a su nombre y haciendo hincapié en la obligatoriedad de su uso** y mantenimiento en buen estado. Los mismos serán de uso exclusivo de cada operario.
Son de uso obligatorio para toda persona que transite y/o desarrolle tareas en la obra.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

- **Ropa de trabajo. Camisa y pantalón largo abrochados.**
- **Casco.**
- **Antiparras.**
- **Guantes.**
- **Calzado de seguridad.**
- **Arnés y cola de amarre con mosquetón grande en un extremo para trabajo en altura.**

7. PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIAS

7.1 Accidente / incidente

Todo personal que sea informado u observe que una persona ha sido víctima de un accidente, deberá comunicar dicha situación a su superior, éste se encargará de los primeros auxilios y de la derivación a la ART para los servicios médicos correspondientes.
La empresa BAGJ CONSTRUCTORA SRL ha contratado a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo PROVINCIA A.R.T., que cubre a todo el personal de la empresa, asimismo se informará al personal, a través de instructivos, sobre el procedimiento a seguir en caso de accidente.

Procedimiento:

- La información primaria debe hacerse verbalmente al Jefe de Obra ó Supervisor, salvo que la gravedad del accidente / incidente lo impida, en ese caso, la primera persona que descubra el acontecimiento deberá cubrir ese paso.
- Se liberará el acceso a la persona accidentada.
- NO MOVER AL ACCIDENTADO, solamente acompañarlo y alentarlo, salvo que él mismo se incorpore.

  El Jefe de Obra o Supervisor, o la persona que asuma el rol de informar, con los datos de la persona accidentada y una mínima explicación del accidente y/o estado de la persona involucrada, debe en primer término informar a la ART.

  Luego deberá comunicar verbal, telefónicamente o por fax, al responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de BAGJ CONSTRUCTORA SRL, quien llevará adelante la investigación y clasificación del hecho acontecido.

  Posteriormente, deberá completar y remitir inmediatamente la planilla de denuncia de accidente / incidente a la ART.

7.2 Incendio:

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

Todo el personal que desempeñe tareas en la Obra será instruido en caso de presentarse una "Emergencia de Incendio".

Procedimiento

1) En caso de principio de incendio se deberá:

- Dar la alarma.
- Extinguir con los extintores portátiles.

2) En caso de un incendio mayor (descontrolado) se deberá:

- Dar la alarma.
- Evacuar la zona.
  - Todo el personal del área interrumpirá su trabajo.
  - Desconectará todo equipo eléctrico.
  - Despejará los caminos de cualquier objeto.
  - Se retirará de la zona en calma y sin correr.
  - El personal se reunirá en un sitio preestablecido y se controlará la presencia de todo el personal de la obra.
- Avisar a los bomberos.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

RIESGOS EMERGENTES PREVISTOS POR ETAPAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Se detallan por etapas las tareas relevantes y los riesgos emergentes de cada una de ellas, permitiendo de tal forma precisar las medidas de prevención que se deberán adoptar a efectos de neutralizar los riesgos mencionados.

ETAPAS	NIVELES y DESCRIPCION	RIESGOS EMERGENTES	MEDIDAS PREVENTIVAS
ALBAÑILERIA Y TAREAS GENERALES -	Revoques y reparación de revoques, canalizaciones, revestimientos. Y colocación de pisos y zócalos. Reparación de Perdidas de Agua	• Uso de andamios de un solo cuerpo, o escaleras, riesgo potencial de caídas. • Caídas de objetos sobre trabajadores. • Aplastamiento o aprisionamiento de manos o pies. • Absorción de partículas en suspensión • Lesiones oculares por proyección de partículas durante el corte de materiales. • Heridas cortantes por el uso herramientas y manipulación de herramientas punzo-cortantes • Lesiones producidas por clavos, alambres y maderas. • Esfuerzos y falsos movimientos • Electrocución por mal estado de máquinas herramientas (Taladros, amoladoras, cortadoras de cerámicos, roscadoras, etc. • Caídas a nivel o distinto nivel	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal: Casco, Guantes de cuero, Botines de seguridad, Camisa y Pantalón largos abrochados. Cuándo corresponda: Protección Respiratoria y/o Ocular. • Control de toda maquinaria intervinientes • Los materiales a montar o desmontar en altura serán sujetándolos adecuadamente. • Instalación de señalización y límites físicos para la circulación de personas, así como para el estibado de materiales. • Orden y limpieza en la obra. • Máquinas eléctricas de corte, protección del disco de corte y elementos de protección, uso de pantalla de protección facial. • Atención al movimiento de cargas. El personal que participe en el movimiento de materiales utilizara en todo momento guantes de descarne, para evitar cortes durante el manipuleo de los mismos.

Empleador

BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L.
OBRAS Y SERVICIOS
CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE
APODERADO

Director de Obra

Arq. MilagrosPandre
Mat CPAU 31056

Responsable de Higiene y Seguridad

Lic. Revuelta Juan Martin
Seg. Hig. y Control Ambiental
Mat. CPIC 61

			• Uso de escaleras de madera sin pintar, doble hoja y con retención de apertura, no siendo permitido pararse en los últimos tres escalones, máxima altura 2.5 metros.
TABIQUES DE DURLOCK NUEVOS, CIELORRASOS	Divisiones de Durlock Y Cielorrasos	• Absorción de partículas en suspensión • Lesiones oculares por proyección de partículas • Heridas cortantes por el uso herramientas y manipulación de herramientas punzo cortantes • Lesiones producidas por clavos, alambres y maderas utilizados en los trabajos • Esfuerzos y falsos movimientos • Caídas a nivel y a distinto nivel. • Electrocución por uso de herramientas eléctricas	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal: Casco, Guantes de cuero, Botines de seguridad, Camisa y Pantalón largos abrochados. • Control de conexión eléctrica de toda maquinaria • Se utilizaran plataformas de trabajo • Trabajos sobre andamios se efectuarán con arnés y cola de amarre • Atención al movimiento de cargas. El personal que participe en el movimiento de materiales utilizara en todo momento guantes. Capacitación sobre movimientos de carga. • Control de toda maquinaria intervinientes • Los materiales a montar en altura serán sujetándolos adecuadamente. • Instalación de señalización y límites físicos para la circulación de personas, así como para el estibado de materiales. • Orden y limpieza en la obra.
TRASLADO Y MONTAJE DE VIDRIOS	Manipulaciones a distintos niveles y montajes.	• Absorción de partículas en suspensión • Lesiones oculares por proyección de partículas	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal: Casco, Guantes de cuero, Manoplas de cuero, Botines de seguridad, Camisa y

Empleador | **Director de Obra** | **Responsable de Higiene y Seguridad**

BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L.
OBRAS Y SERVICIOS
CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE
APODERADO

Arq. MilagrosPandre
Mat CPAU 31056

Lic. Revuelta Juan Martin
Seg. Hig. y Contol Ambiental
Mat. CPIC 61

		• Heridas cortantes por el uso herramientas y manipulación de herramientas punzo cortantes • Lesiones producidas por los vidrios • Proyecciones de partículas • Esfuerzos y falsos movimientos • Caídas a nivel y a distinto nivel. • Electrocución por uso de equipos eléctricos	Pantalón largos abrochados. Protección Ocular o máscara facial • Programación previa de las tareas a ejecutar • Limpieza y orden de los lugares donde circula el o se transporta el material • Usar herramientas aptas y en buen estado de conservación • No se permitirá la presencia de personas en las zonas donde se esté trabajando con vidrios para lo cual se marcara la zona mediante cintas de peligro o similar. • Uso de tirantes o durmientes de madera y restos alfombras para apoyo de los vidrios • Uso de ventosas para piezas de gran tamaño • Capacitación sobre movimientos de carga • Capacitación de los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes o sobreesfuerzos. • Andamios de un solo cuerpo, con plataforma de 60 cm de ancho y baranda a 1 mt sobre el nivel de la plataforma. Máximo dos personas sobre un módulo de andamio • Trabajos sobre andamios se efectuarán con arnés y cola de amarre Los arneses de seguridad se revisarán siempre antes de su uso • Una vez instalados los vidrios pintar su superficie con marcas para advertir su presencia

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

HERRERIA Y CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO Y MADERA Y	carpintería metálica, madera y aluminio Colocación de puertas y vanos	• Absorción de partículas en suspensión • Lesiones oculares por proyección de partículas durante el corte de materiales. • Heridas cortantes por el uso herramientas y manipulación de herramientas punzo-cortantes • Lesiones producidas por clavos, alambres y maderas. • Esfuerzos y falsos movimientos • Caídas a nivel y desnivel • Lesiones oculares por proyección de partículas • Riesgo eléctrico por el uso y manipulación de herramientas eléctricas	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal: Casco, Guantes de descarne, Botines de seguridad, Camisa y Pantalón largos abrochados, antiparras, mascara de soldar y delantal de soldador. • Capacitación sobre movimientos de carga. • Control de toda maquinaria intervinientes. • Instalación de señalización y límites físicos para la circulación de personas, así como para el estibado de materiales. • Orden y limpieza en la obra. • Uso de escaleras de doble hoja no siendo permitido pararse en los últimos tres escalones. • Andamios de un solo cuerpo, con plataforma de 60 cm de ancho y baranda a 1 mt sobre el nivel de la plataforma. Máximo dos personas sobre un módulo de andamio uso de arnés y cola de amarre a punto fijo Uso permanente de arnés y cola de amarre que se enganchara a puntos fijos cuando se efectúen trabajos con exposición al vacío • Alargadores eléctricos en condiciones, conectados a tablero con protecciones y disyuntor, no se permitirán cables sin la correcta aislación. • Afianzar las partes inestables de la construcción. Examinar previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por el trabajo • Control de conexión eléctrica de toda maquinaria

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

			• Toda herramienta eléctrica deberá estar conectada un tablero con disyuntor, térmica y puesta a tierra. • La Soldadora deberá usarse con protección facial y ocular, además del guardapolvo o delantal de soldador y guantes para soldador y deberá estar conectada a un tablero. • La amoladora deberá siempre llevar la protección del disco y estar conectada a un tablero. • Al usar amoladora se deberá contar con protección facial y ocular.
PINTURA GENERAL	Cielorrasos y pintura interior.	• Absorción de partículas en suspensión • Lesiones oculares por proyección de partículas • Caídas a nivel y en desnivel • Heridas cortantes por el uso herramientas y manipulación de herramientas punzo-cortantes	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal • Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles y rotativas se evitará el uso de ropas sueltas, anillos y relojes. • Máquinas eléctricas de corte, protección del disco de corte y elementos de protección, uso de pantalla de protección facial. • Escaleras en buen estado de conservación con limite de apertura y tacos antideslizantes. • No pararse en los últimos peldaños de la escalera • Mantener orden y limpieza
USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y RIESGO	Trabajos con Herramientas eléctricas y el uso de tableros y líneas energizadas en general	• Lesiones en la manipulación de cables, tableros, etc. • Electrocución por mal estado de máquinas herramientas • Electrocución por ensayos	• La instalación de la Energía eléctrica de Obra se efectuara a partir de un tablero principal con térmica y disyuntor y puesta a tierra, no habrá cables eléctricos en el piso, en ninguna etapa de la Obra.

Empleador **Director de Obra** **Responsable de Higiene y Seguridad**

BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L.
OBRAS Y SERVICIOS
CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE
APODERADO

Arq. MilagrosPandre
Mat CPAU 31056

Lic. Revuelta Juan Martin
Seg. Hig. y Control Ambiental
Mat. CPIC 61

ELECTRICO EN GENERAL		• Riesgo eléctrico por el uso y manipulación de herramientas eléctricas	• Los cables de derivación serán aéreos, de la sección adecuada, y con su aislación y sin cortes • Alargadores eléctricos en condiciones, conectados a tablero con protecciones y disyuntor, no se permitirán cables sin la correcta aislación. • Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles y rotativas o alternativas se evitará el uso de ropas sueltas, anillos y relojes. • Máquinas eléctricas de corte, protección del disco de corte y elementos de protección, uso de pantalla de protección facial. • La iluminación debe ser adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y el movimiento. • Control de conexión eléctrica de toda maquinaria • Los cables de las máquinas y/o herramientas eléctricas, se revisaran semanalmente. • Las instalaciones eléctricas provisorias reunirán las condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica • El tablero de obra deberá contar con adecuada puesta a tierra, y protector diferencial
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS	Levantamiento de cargas, equipos y/o materiales	• Lesiones por esfuerzos en el movimiento de materiales. • Esfuerzos y falsos movimientos	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal: Casco, Guantes de cuero,

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

		• Caídas a nivel y a distinto nivel.	Manoplas de cuero, Botines de seguridad, Camisa y Pantalón largos abrochados y Protección Ocular • Instalación de barreras y límites físicos para la circulación de personas, así como para el estibado de materiales. • Atención al movimiento de cargas. El personal que participe en el movimiento de materiales utilizara en todo momento guantes de descarne, para evitar cortes durante el manipuleo de los mismos • Programación previa de las tareas a ejecutar • Limpieza y orden de los lugares donde circula el o se transporta el material • Usar herramientas aptas y en buen estado de conservación • Al levantar una carga, flexionar las rodillas, no arquear la espalda. Esta debe mantenerse recta para evitar lesiones en la espalda. • Siempre utilizar piernas y brazos para ejercer la fuerza. • Si el objeto a transportar es muy pesado, utilizar una "zorra" o carrito o carretilla, pedir ayuda a un compañero en caso de necesitarlo. • Que la carga no obstaculice la visión para poder circular de forma segura. • No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas, girar moviendo los pies. • Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

			• Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. • Correcta estiva de materiales para evitar obstaculizar los pasillos de circulación, o para evitar la caída de los mismos.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL COVID 19	Toda etapa de la obra y traslados desde la casa a la obra y vuelta	• Contagiarse o contagiar el virus Covid 19	• VER PROTOCOLO ADJUNTO AL FINAL DEL PROGRAMA DONDE SE DETALLA TODO LO NECESARIO A IMPLEMENTAR PARA EVITAR LA PRPAGACION DEL VIRUS
TERMINACION	Limpieza general	• Absorción de partículas en suspensión • Caídas a nivel y a distinto nivel. • Esfuerzos y posiciones inadecuadas	• Uso correcto y permanente de los elementos de protección personal • Uso de escaleras de doble hoja no siendo permitido pararse en los últimos tres escalones

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Dentro y fuera de la zona de ejecución de la obra todo el personal involucrado deberá desempeñar las tareas aplicando pautas de conductas y procedimientos para minimizar el deterioro ambiental.

La Dirección de obra instruirá convenientemente a su personal sobre la protección del ambiente y verificará su cumplimiento.

Conceptos generales

Para la disposición de residuos sólidos o efluentes líquidos se consideran dos conceptos a saber:

1. **Reducir** la generación de residuos o efluentes en forma compatible con la tarea a desarrollar.

   Recuperar de los residuos o efluentes los elementos o materiales que resulte posible.

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

PROTOCOLO DE ACTUACION CONTRA EL COVID 19

1. Objetivo

El documento establece medidas de gestión y prevención ante la pandemia del Nuevo Coronavirus 2019, y es aplicable a todos los trabajadores de la empresa durante la ejecución de sus actividades
Este documento será de aplicación mientras dure la emergencia relacionada con la propagación del virus y podrá estar sujeto a actualizaciones en caso de que se produzcan cambios en la situación o se presenten solicitudes específicas a raíz de cambios normativos o solicitudes de las autoridades sanitarias correspondientes

2. Información general COVID-19

Coronavirus

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19

COVID-19

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Síntomas COVID-19

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores y molestias, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas generalmente son leves y comienzan gradualmente. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar. Las personas mayores, y aquellas con problemas médicos subyacentes como presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades graves.

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

Las personas con fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

Formas de contagio

Las personas pueden contraer COVID-19 de otras personas que tienen el virus.
La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca que se propagan cuando una persona con COVID-19 tose o exhala. Estas gotas caen sobre objetos o superficies y si otras personas tienen contacto con estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca se contagian de COVID-19.
Las personas también pueden contraer el COVID-19 si inhalan gotitas de una persona con COVID-19 que tose o exhala gotitas. Es por eso que es importante mantenerse a más de 2 metros de distancia de una persona enferma.
La OMS está evaluando la investigación en curso sobre las formas en que COVID-19 se propaga y continuará compartiendo resultados actualizados.

3. Recomendaciones generales para traslados.

- Siempre que sea posible, se realiza trabajo remoto
- Las reuniones se realizan mediante conferencia telefónica o video conferencia
- En viajes cortos intentá caminar o utilizar bicicleta, así permitís más espacio para quienes no tienen otra alternativa de traslado.
- Recordá la importancia de una buena higiene de la manos antes, durante y después de los desplazamientos que vayas a realizar.
- Desplázate provisto de un kit de higiene personal
- Si está a tu alcance desplázate en tu vehículo particular: recordá mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.
- **No utilizar el transporte público para desplazarse desde y hacia el trabajo.**

4. Medidas preventivas en el ámbito laboral

Durante la ejecución de actividades se dará cumplimiento a las siguientes medidas preventivas:

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

- Siempre que sea posible se aislará al trabajador, a fin de evitar que entre en contacto con personas infectadas o con sospecha de que puedan estarlo.
- En caso de ser necesario se colocarán mamparas, pantallas o cortinas adecuadas para separar a los trabajadores entre sí y del público en general.
- Se deberá realizar el trabajo reduciendo la dotación al mínimo posible, sin que aumente la situación de riesgo del trabajador.
- Se deberá proveer a los trabajadores todos los elementos de higiene y seguridad que sean necesarios y adecuados para el desarrollo de la tarea.
- En los lugares de atención al público el responsable del área designado deberá controlar y restringir el ingreso de clientes de manera de garantizar una distancia de separación mínima de 2 metros entre cada persona.
- Los trabajadores que pertenecen a un grupo de riesgo (mayores de 60 años o con histórico medico de presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes) deben ser objeto de atención especial, priorizando su permanencia en el hogar en el teletrabajo o el trabajo remoto.
- Asegurar el abastecimiento de alcohol gel o agua y jabón a disposición para limpieza de manos frecuente.
- Limpiar ambientes de trabajo y vehículos según el protocolo de limpieza y desinfección establecido en el presente documento.
- Trabajo en áreas abiertas y libres de aglomeraciones
- Distancia de 2m mínimo entre personas
- Se mantienen los ambientes ventilados
- Se establece cantidades Mínimas de trabajadores en nuestra área de trabajo.
- Priorizar coordinaciones vía teléfono
- No compartir objetos personales: Vasos, tazas, EPP, toallas, etc.
- Informar cualquier desviación al Superior inmediato.

ORGANIZACIÓN DE INGRESOS:

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

Realizar un estricto control de las personas que ingresen al Obrador.

Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra. Al ingreso se interrogará al trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) y se procederá a la toma de la temperatura corporal; afectando personal idóneo a tal efecto.

Los trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37,5° (grados centígrados) NO PODRÁN INGRESAR A LA OBRA y se comunicará la situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción.
El equipo encargado de la tarea de control de ingreso debe estar equipado con un traje tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex.

El ingreso de los trabajadores debe hacerse respetando el distanciamiento social, en las dependencias internas, administración, pañol, etc, a efectos de evitar aglomeraciones, coordinando entre personal propio y trabajadores de las empresas, los cuales deberán tener accesos escalonados al depósito y otras dependencias, para el retiro de materiales, diagramación de las órdenes de trabajo, retiro de vehículos, etc.

Producir un Cronograma de Ingresos escalonado o respetando el distanciamiento social de acuerdo con la actividad que realiza la EC. La Empresa, el Jefe del Obrador, el Responsable de Higiene y Seguridad, deben conocer la secuencia de ingreso de las empresas participantes.

Promover. Si es posible, distintos turnos de trabajo, a efectos de distribuir temporalmente al personal, en aquellos casos donde la distribución espacial dificultaría la continuidad operativa.

Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de proveedores.

La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación mínima entre trabajadores de 2 metros

PROCESO DE INGRESO

Control 0: Registro de Asistencia, determinado por la empresa.
•**Control 1:** Manteniendo el distanciamiento social, se realizará la vigilancia de síntomas compatibles **mediante termómetro infrarojo**.
•Se efectuará un control verbal inmediatamente sucesivo, en el ingreso principal de obra, de carácter epidemiológico, completando un informe a través de un

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

cuestionario. Se indagará al trabajador/a sobre la existencia de alguno de los **síntomas** (tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, decaimiento, afectación olfato y gusto, etc.), **forma en que se transportó a la obra** y la existencia de eventuales **convivientes** con casos sospechosos ó confirmados.

•Se procederá a la **toma de su temperatura corporal, y se registrará.**

•Se afectará personal idóneo y capacitado a tal efecto, dispuesto por la Empresa Contratista Principal.

•Este personal documentará toda esta información en un **Registro de Ingresos,** incluyendo datos personales y datos de contacto, de cada persona que ingresa, sin importar su función. Los datos personales a relevar son nombre, apellido, DNI y firma. Se registrarán y documentarán datos en dos columnas diferenciadas: censo de temperatura corporal y síntomas compatibles con COVID-19.

•Previo a la firma del Registro de Ingresos, el trabajador se lavará y desinfectará sus manos, y se le leerá su declaración, incluyendo la conclusión "*La veracidad de los datos y síntomas, cuida la salud de todos sus compañeros, familiares y convivientes, y ayuda neutralizar a la propagación del COVID-19*".

•Se desinfectará el bolígrafo empleado para la firma del registro de ingresos, entre cada uno de los usos.

•El personal ingresa a vestuario o sus rutinas.

SALIDAS DURANTE LA JORNADA:

- El personal se lavará sus manos.
- Ningún elemento de protección ni ropa de trabajo debe ser llevado por el trabajador a su domicilio, y si se efectúa deberá definirse su manera adecuada y preventiva. Si por tipo de obra y/o por su ubicación geográfica, o por circunstancias temporales de facilidad de movilidad, la Empresa utiliza transportes para el personal trabajador constructor, deberá confeccionar los lineamientos en un documento denominado "Anexo al Protocolo sobre las condiciones del Transporte", empleando documento que acompaña al presente como plataforma de base.

Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la empresa y delegado; pudiéndose asignar un único trabajador por cada 10 compañeros/as trabajadores/as.

- **Información y comunicación al personal**
- La organización estará en colaboración y en continua atención a las indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As y cada

Jurisdicción en relación con la evolución del COVID-19, así como de las medidas que haya que adoptar.

- Para asegurar que los trabajadores tengan conocimiento de los procedimientos de salud y seguridad durante la Pandemia de COVID-19 se realizarán continuos entrenamientos y charlas, considerando:
- *Se colocará cartelería específica al nuevo riesgo laboral.*

4.1 Personal con trabajo remoto

- Medidas de prevención contra el COVID-19
- Flujo de comunicación en caso de sospecha o confirmación de contagio.
- Actualización de información relacionada COVID-19
- Cuidados de salud física y mental durante el trabajo remoto

4.2 Personal con trabajos en el ámbito laboral

- Medidas de prevención contra el COVID-19
- Prácticas de trabajo seguras
- Equipos de protección personal aplicable
- Limpieza y desinfección de área de trabajo y herramientas
- Flujo de comunicación en caso de sospecha o confirmación de contagio.
- Cuidados de salud física y mental durante la cuarentena
- Actualización de información relacionada COVID-19

- *La jefatura de obra debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes separaciones entre los puestos de trabajos activos con un factor de ocupación máximo de 1 persona/4 a 6m2, manteniendo 2 m de separación, priorizando el trabajo autónomo y aislado.*

5. Higiene, Limpieza, desinfección

5.1 Medidas de higiene personal

- Lavarse las manos con frecuencia (no menos de 4 veces al día), especialmente tras la manipulación de equipos de trabajo.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

de acuerdo al Protocolo de limpieza de manos - **Anexo 01**.

- Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y cualquier persona que esté tosiendo o estornudando.
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Cubra su boca y nariz con el codo o pañuelo doblado cuando tose o estornuda. Luego deseche el tejido usado inmediatamente. Las gotas propagan el virus. Al seguir una buena higiene respiratoria, protege a las personas que lo rodean de virus como el resfriado, la gripe y COVID-19.
- Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.
- *Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas.*

5.2 Limpieza de área de trabajo

Se refuerza la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, materiales, herramientas y automóviles. Esta limpieza extraordinaria se incide especialmente en áreas/objetos que son propensos de ser tocados por varias personas.

El empleador debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a los fines de mantener sus obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de máxima limpieza.

- Se deberán reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes particularmente comedores y sanitarios, aumentando la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos.
- Minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en forma simultánea
- Todos los vestuarios deberán serán debidamente desinfectados al finalizar la jornada laboral: Deberá lavarse con lavandina a los pisos, bancos y grifos.
- Indicar que el uso de artículos de uso personal como el mate, botellas, cubiertos y vajilla sea únicamente para uso exclusivo no debiendo compartirse los mismos bajo ningún concepto.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

- Ventilar frecuentemente los ambientes, posibilitando la apertura de ventanas.

Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc. Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas diarias.

Aumentar la frecuencia de limpieza en mesas, mostradores, puertas, barandas, toma de la luz, teléfonos, computadoras compartidas, grifos, suelos, con los productos de limpieza para eliminar la existencia de posibles virus.
El proceso se realiza siguiendo los protocolos establecidos de Limpieza de área de trabajo - **Anexo 2**, y limpieza de automóviles - **Anexo 3**

6. Equipos de protección personal

Equipos de protección personal según la tabla de control de infecciones

Situación	EPP y medidas de control
Trabajador en áreas limpias y desinfectadas, libre de personas potencialmente infectadas	Distancia de seguridad.
Ingreso a áreas que no están bajo nuestro control o con personas potencialmente infectadas.	Mascarilla*, guantes** de vinilo o nitrilo, protección ocular, distancia de seguridad.
Contacto directo con personas potencialmente infectadas.	Respirador N95, EPP de protección contra salpicaduras, guantes de nitrilo o vinilo, protección ocular

* Protocolo de uso de mascarilla – Anexo 04
** Protocolo para uso de guantes - Anexo 05

7. Flujo de acción en caso de sospecha de COVID-19

Para cualquier persona que presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con enfermo infectado por

COVID-19 confirmado, se recomienda que se quede en su domicilio o alojamiento y deberá contactar al número 148 (Provincia)107 (Caba) y comunicarlo al Área de Salud y Prevención de la Provincia de Buenos Aires, o bien a través del 0800-222-1001 opción 1. Las 24hs los 365 días del año.
Igualmente, si esta sintomatología se presentara durante el desarrollo de su actividad labórale, se deberá evitar el contacto cercano con las demás personas, siguiendo en todo momento las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud. Derivar al servicio médico, en caso que no cuente con uno el establecimiento contará con barbijos y tendrá un recinto para poder aislarlo, así se evita un potencial contagio, y esperar al sistema de salud.
En ambos casos y a la espera de valoración médica, se deben seguir las siguientes indicaciones:
Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas con la boca, nariz y ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u objetos. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando se tosa o estornude, o utilizar para ello la parte interna del codo. Evitar contacto cercano con otras personas. Mantener la habitación o recinto aireada.
Producido el traslado del paciente, se desinfectará la “Zona Establecida de Aislamiento


Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

8. Anexos

Anexo 01 - Protocolo de limpieza de manos (água y jabon)


Como lavar las manos?

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

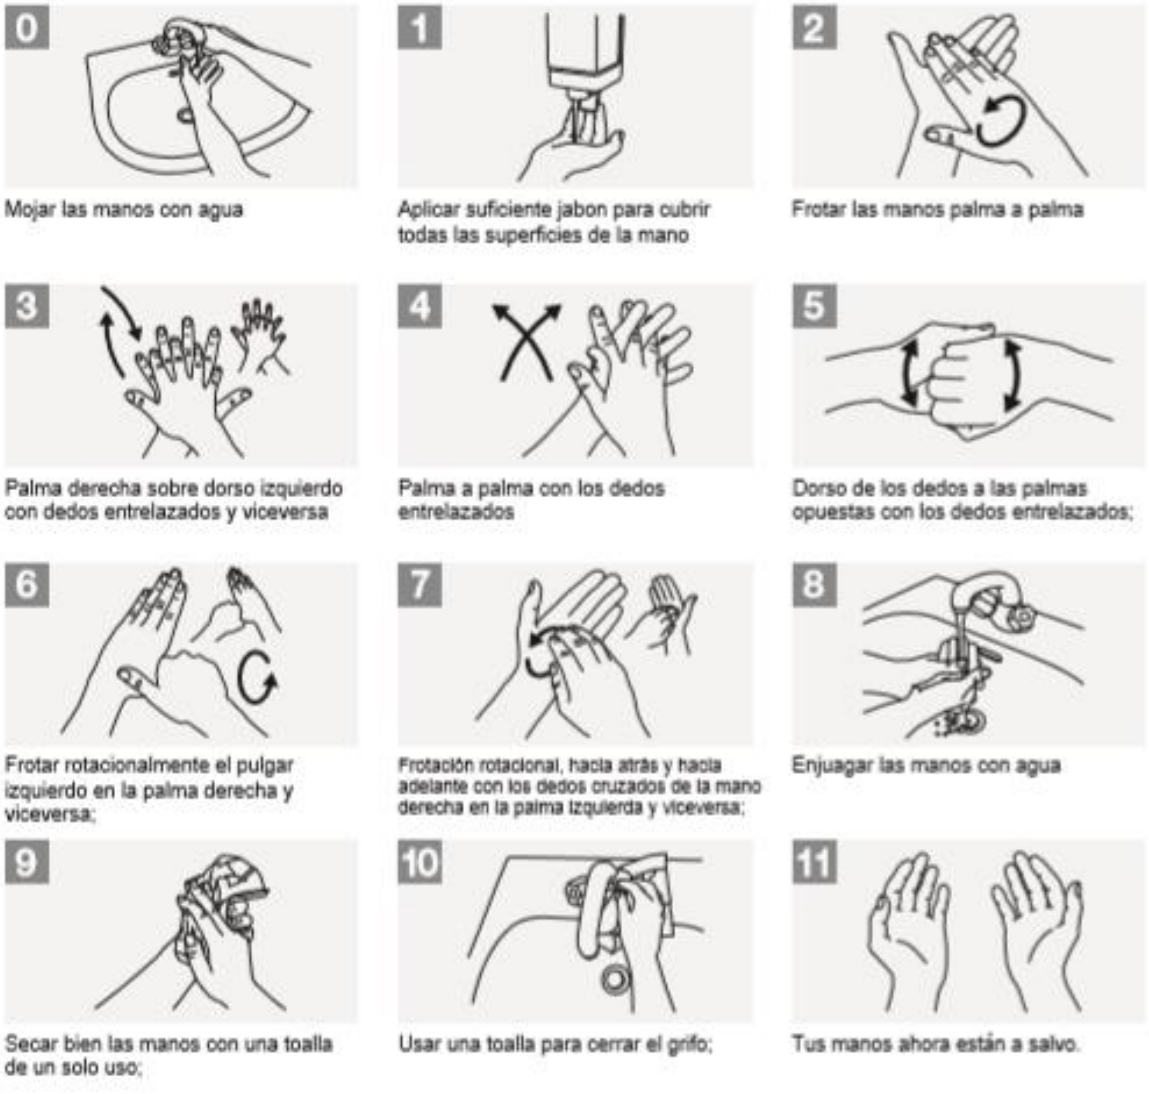


Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61


Anexo 01 - Protocolo de limpieza de manos (alcohol en gel)

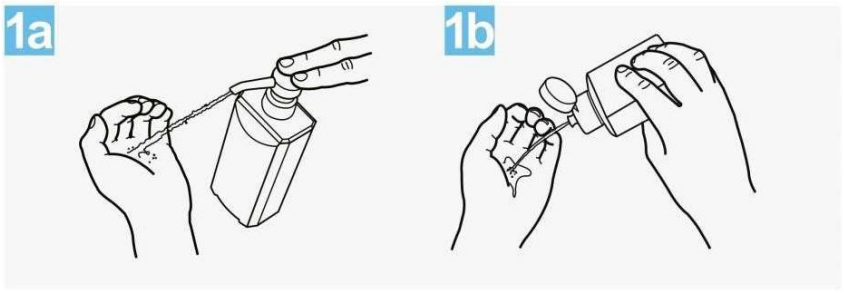


Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;



Frótese las palmas de las manos entre si;




Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;




Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Una vez secas, sus manos son seguras.

Crédito: OMS

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

Anexo 02 - Protocolo de limpieza de área de trabajo

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre

Evitar la limpieza en seco para no remover polvo, se realizará arrastre húmedo

Realizar una limpieza frecuente en zonas como oficinas, salas de reunión, etc. Es importante extremar las medidas de higiene en estos lugares debido al alto tránsito de personas en las mismas.

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%.

Es posible utilizar otro tipo de desinfectante. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal que realiza la limpieza.

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe priorizar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de trabajo) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 °C) y agregar detergente para la ropa.

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los trabajadores con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, herramientas, entre otras.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

Equipos de protección personal durante la limpieza

Cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección de lugares de trabajo se debe hacer uso de Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables (no quirúrgicos) barbijo tipo N95 o similar, protección ocular o facial

Para el adecuado retiro de los guantes, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes.

Luego de la limpieza y desinfección de áreas de trabajo, se debe realizar la higiene de manos, de acuerdo al protocolo establecido.

Manejo de residuos

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables generados en el área de trabajo, se podrán eliminar como residuos sólidos industriales, los que deben ser dispuestos en áreas autorizadas

Se asegura la disposición en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos o peligrosos, esto se debe disponer en lugares autorizados para residuos peligrosos.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

Anexo 3 - Protocolo de limpieza de Vehiculos

Antes de poner el motor en marcha, así como antes de salir del vehículo se debe realizar limpieza del volante, la palanca de cambios, las ventanillas, los apoyabrazos y los tiradores de las puertas con una toalla desechable.

Al finalizar laboral se debe realizar una limpieza más profunda y desinfectar el auto, con un trapo impregnado con alcohol. Pásalo por todas las superficies con frecuencia, sobre todo en las zonas que han estado en contacto con conductor y pasajeros. Hazlo tanto por dentro como por fuera del habitáculo.

Considerar la limpieza con empresas que ofrecen higienización y desinfección de autos a profundidad.
Como desinfectar el auto paso a paso:

- En primer lugar, comienza por aspirar lo mejor posible todo el habitáculo para eliminar la suciedad que pueda haber dentro.
- Las alfombrillas son los elementos que más se ensucian dentro del vehículo, pues las pisamos constantemente y esto hace que requieran una limpieza más exhaustiva. Si son de goma, basta con limpiarlas fuera del coche con una manguera a presión y dejarlas secar al sol. En el caso de que sean de tela, debes sacudirlas con fuerza, pasarles un cepillo de cerdas suaves y aspirarlas para retirar todos los restos de suciedad.
- Es fundamental que se limpie también las rejillas de ventilación del vehículo para respirar aire limpio dentro del habitáculo. Para ello, lo mejor será utilizar un pincel seco o una aspiradora, sin olvidarnos de limpiar las ventanillas con limpiacristales y papel húmedo.

Consejos para viajar en un auto compartido

- Limpieza de manos antes de ingresar al vehículo
- Si estornudas, hazlo siempre poniendo la parte interior del codo, y evita tocarte durante todo el trayecto la boca, los ojos y la nariz.
- Al salir del vehículo, lava las manos con agua y jabón o, en su defecto, usa gel desinfectante para manos.

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Control Ambiental Mat. CPIC 61

Anexo 04 - Protocolo de uso de mascarilla

Si se requiere llevar la mascarilla, esta se debe ajustar perfectamente a la cara. Es esencial seguir las siguientes indicaciones de la Organización Mundial de la Salud:


- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.
- Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
- Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.
- Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
- La máscara nunca debe ser compartida entre trabajadores



1. Retire el protector del envase.



4. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello.



2. Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los elásticos libres. No tocar el interior del mismo.



5. Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos.



3. Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. Pase el elástico superior sobre su cabeza.



6. Ajuste correctamente la máscara.

Empleador	**Director de Obra**	**Responsable de Higiene y Seguridad**
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

Anexo 05 - Protocolo para uso de guantes

Para utilizar guantes y que sean eficientes, es sumamente importante saber como sacar los guantes y no tocarse la cara cuando los llevamos puestos, de esta forma funcionarán como una capa de protección.
Para quitarnos los guantes debemos seguir los siguientes pasos:

- Agarra la parte exterior del guante por la muñeca sin tocar tu piel.
- Despega el guante de tu mano, tirando de él de dentro hacia fuera.
- Sostén el guante que acabas de sacar con la mano que aún está enguantada.
- Despega el segundo guante metiendo los dedos dentro de él, a la altura de la muñeca.
- Da la vuelta al segundo guante mientras lo despegas de tu mano y dejas el primero dentro de este.
- Desecha los guantes a la basura sin reutilizarlos en ningún caso.
- Lávate las manos con agua y jabón inmediatamente después de desechar los guantes.

Protocolo para uso de guantes

Colocación de guantes




Con las manos limpias retira los guantes de su caja original



Toca solo la superficie correspondiente a la muñeca (El borde superior)




Primer guante listo



Tome el segundo guante con la mano desnuda y toque solo la superficie correspondiente a la muñeca.



Para evitar tocar la piel del antebrazo con la mano enguantada, gire la superficie externa del guante para hacerla con los dedos doblados de la mano enguantada.

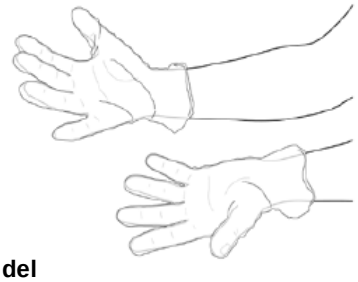

Guantes listos. La mano no debe tocar nada que no esté definido por las indicaciones y condiciones para el uso del guante.

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61


Retiro de guantes



Pellizque un guante al nivel de la muñeca para quitarlo, sin tocar la piel del antebrazo, y quítelo de la mano, permitiendo que el guante se dé la vuelta



Sostenga el guante retirado en la mano enguantada y deslice los dedos de la mano sin guante entre el guante y la muñeca. Quítese el segundo guante rodando por la mano y doble el primer guante.

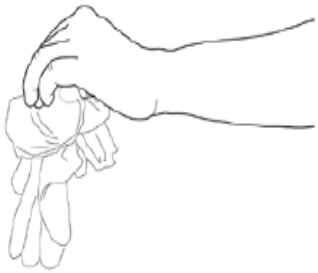

Deseche los guantes removidos

Referencias:

Ministerio de Salud de la Nación Argentina

Organización Mundial de la Salud

Superintendencia de Riesgo del Trabajo

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Cámara Argentina de la Construcción

Empleador	Director de Obra	Responsable de Higiene y Seguridad
BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L. OBRAS Y SERVICIOS CHRISTIAN M. BOARI AGUIRRE APODERADO	Arq. MilagrosPandre Mat CPAU 31056	Lic. Revuelta Juan Martin Seg. Hig. y Contol Ambiental Mat. CPIC 61

Grupo Provincia

Provincia ART

Buenos Aires, 12 de Enero de 2022

Sres.: **BAGJ CONSTRUCTORA S.R.L.**
Contrato: 246234
CUIT**:** 30-71092291-4

Ref.: Recepción de Programa de seguridad y Anexo Covid 19

De nuestra consideración:

Atentos a la situación que hoy en día está transitando el territorio nacional, a consecuencia de la cuarenta dispuesta por el Decreto 297/2020, DECNU-2020-297-APN-PTE; los presentes **Programa de seguridad y Anexo Covid 19**, será considerado **recibido** por medio de esta nota, disponiendo que a la hora de la presentación del documento original en las oficinas de Provincia ART, el mismo no estará alterado siendo exactamente idéntico al presentado en formato digital.

Nos comunicaremos a través del sistema de ventanilla electrónica para empleadores, implementado por la Res 635/08, complementado por la Res 365/09 y modificatorias, a fin de informar la recepción, aprobación y/o rechazo de esta documentación **según corresponda**.

Le recordamos que el plazo de aprobación es de 5 días hábiles desde su recepción y solicitamos mantener actualizados los datos de contacto ya que nos estaremos comunicando por esa vía.

Datos de Programa de seguridad

Resolución N°: 35
Aviso de Obra: 99470 – Estab. 179
Dirección de Obra: NOGOYA 550 – OLIVOS – BUENOS AIRES
Tareas: REFORMAS EN INSTITUCION EDUCATIVA
Fecha inicio de obra: 13/01/2022
Fecha de fin de obra: 13/02/2022
Cant. de folios: 37



Fernando Aredes
Higiene y Seguridad
Gerencia de Prevención

VERSIÓN DIGITAL
